


**Ausführung Mehrfachkastensystem übereinander (Länge > 5.960 mm)  
mit Seitenführungsschienen**

<b>Auftraggeber (Kunde):</b>	<b>SIMON PROtec (Vertrieb):</b>
Projekt: _____	Vorgangsnummer: _____
Name: _____	Bearbeiter: _____
Datum / Unterschrift: _____	Datum / Unterschrift: _____

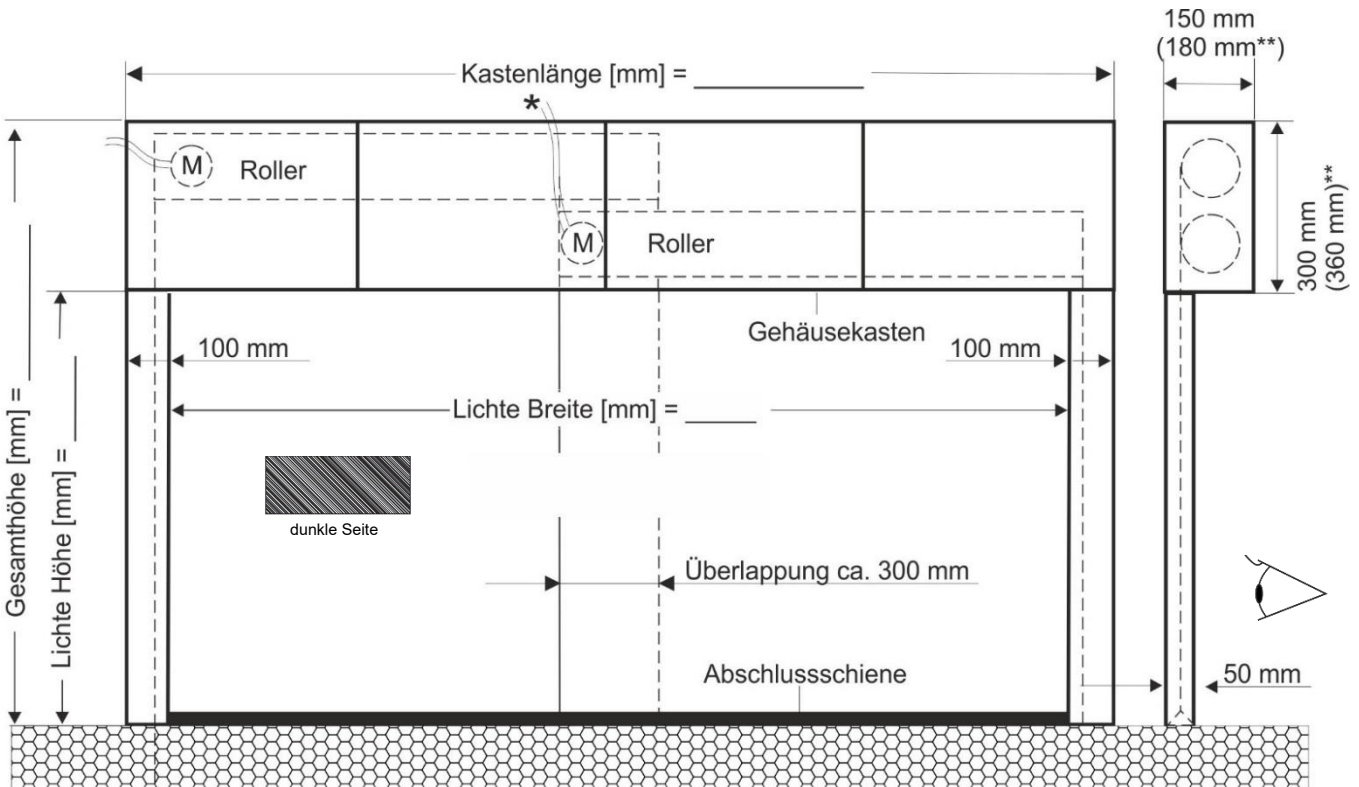

\*\*Abrolllänge > 3.000 mm

**Abmessungen und Motorpositionen:**

Gesamtkastenslänge	Kasten-systeme	Roller-baugruppen	Motorpositionen (bitte ankreuzen) <sup>†</sup>
5.961 – 11.482 mm	4	2	
11.483 – 17.004 mm	6	3	
17.005 – 22.527 mm	8	4	
22.528 – 28.049 mm	10	5	

<sup>†</sup> Ansicht von oben. Ohne Angabe werden alle Rollerbaugruppen standardmäßig mit der Motorposition links ausgeliefert.

**Einbauort:**

- Innenbereich   Außenbereich   Wetterschutzblech  
 Heizung

**Ausführung der Beschichtung:**

- RAL 7035 (Standard)

*Sonderausführung:*

- RAL \_\_\_\_\_  Glanzgrad: \_\_\_\_\_  Sonstiges: \_\_\_\_\_  
 Beschichtung  
 Sichtbare Elemente in Edelstahl


**Befestigung / Wandtyp:**

**Es dürfen nur zugelassene / geprüfte Befestigungsmittel verwendet werden!**

- Beton / Hohlkörperbeton  Porenbeton  
 Vollmauerwerk / Hohlmauerwerk (Ziegel)  Stahlkonstruktion (Promatverkleidung)

**Not-AUF:**  Ja  Nein


**Ausführung Seitenführungsschienen:**



- Wandmontage = SFS mit Montagewinkel

Links

Rechts




- Montage in der Laibung = SFS ohne Montagewinkel


Links

Rechts

**Befestigung Abrollkasten:**



- Wandmontage  
 Für Wandmontage zusätzliche Bohrungen  
an der Abrollkastenrückwand



- Deckenmontage nur in Verbindung  
mit seitlicher Stabilisierung **\*\*Abrolllänge > 3.000 m**

**Steuerungstechnik** (u. U. mit Mehrpreis verbunden):

- SHEV 6 RSV mit AM-835 mit bis zu 2 Rollerbaugruppen 361 x 254 x 111 mm  
 M-SHEV-12-RSV mit AM-835 mit bis zu 4 Rollerbaugruppen 400 x 600 x 200 mm  
 M-SHEV-24-RSV mit AM-835 mit bis zu 8 Rollerbaugruppen 500 x 500 x 200 mm
